


e-overheid planningsoverzicht



- Beleidsstraject afgerond**
- Gegevensmodel gereed**
- Ontwerp gereed**
- Uitwisselingsconcept gereed**
- Wetsvoorstel naar Tweede Kamer**
- Pilots afgerond**
- Organisatie ingericht**
- Start uitrol**
- Overdracht aan beheer**
- Opname in beheerorganisaties**
- Inwerkingtreding wet**
- Aansluiting van alle bestuursorganen op de basisregistratie**

De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning.
 De voortgang wijkt af van de aan de Tweede Kamer afgegeven planning of er is nog geen planning aan de Tweede Kamer gemeld.
 Het wetsvoorstel wordt behandeld door de Eerste Kamer
 Het wetsvoorstel wordt behandeld door de Tweede Kamer

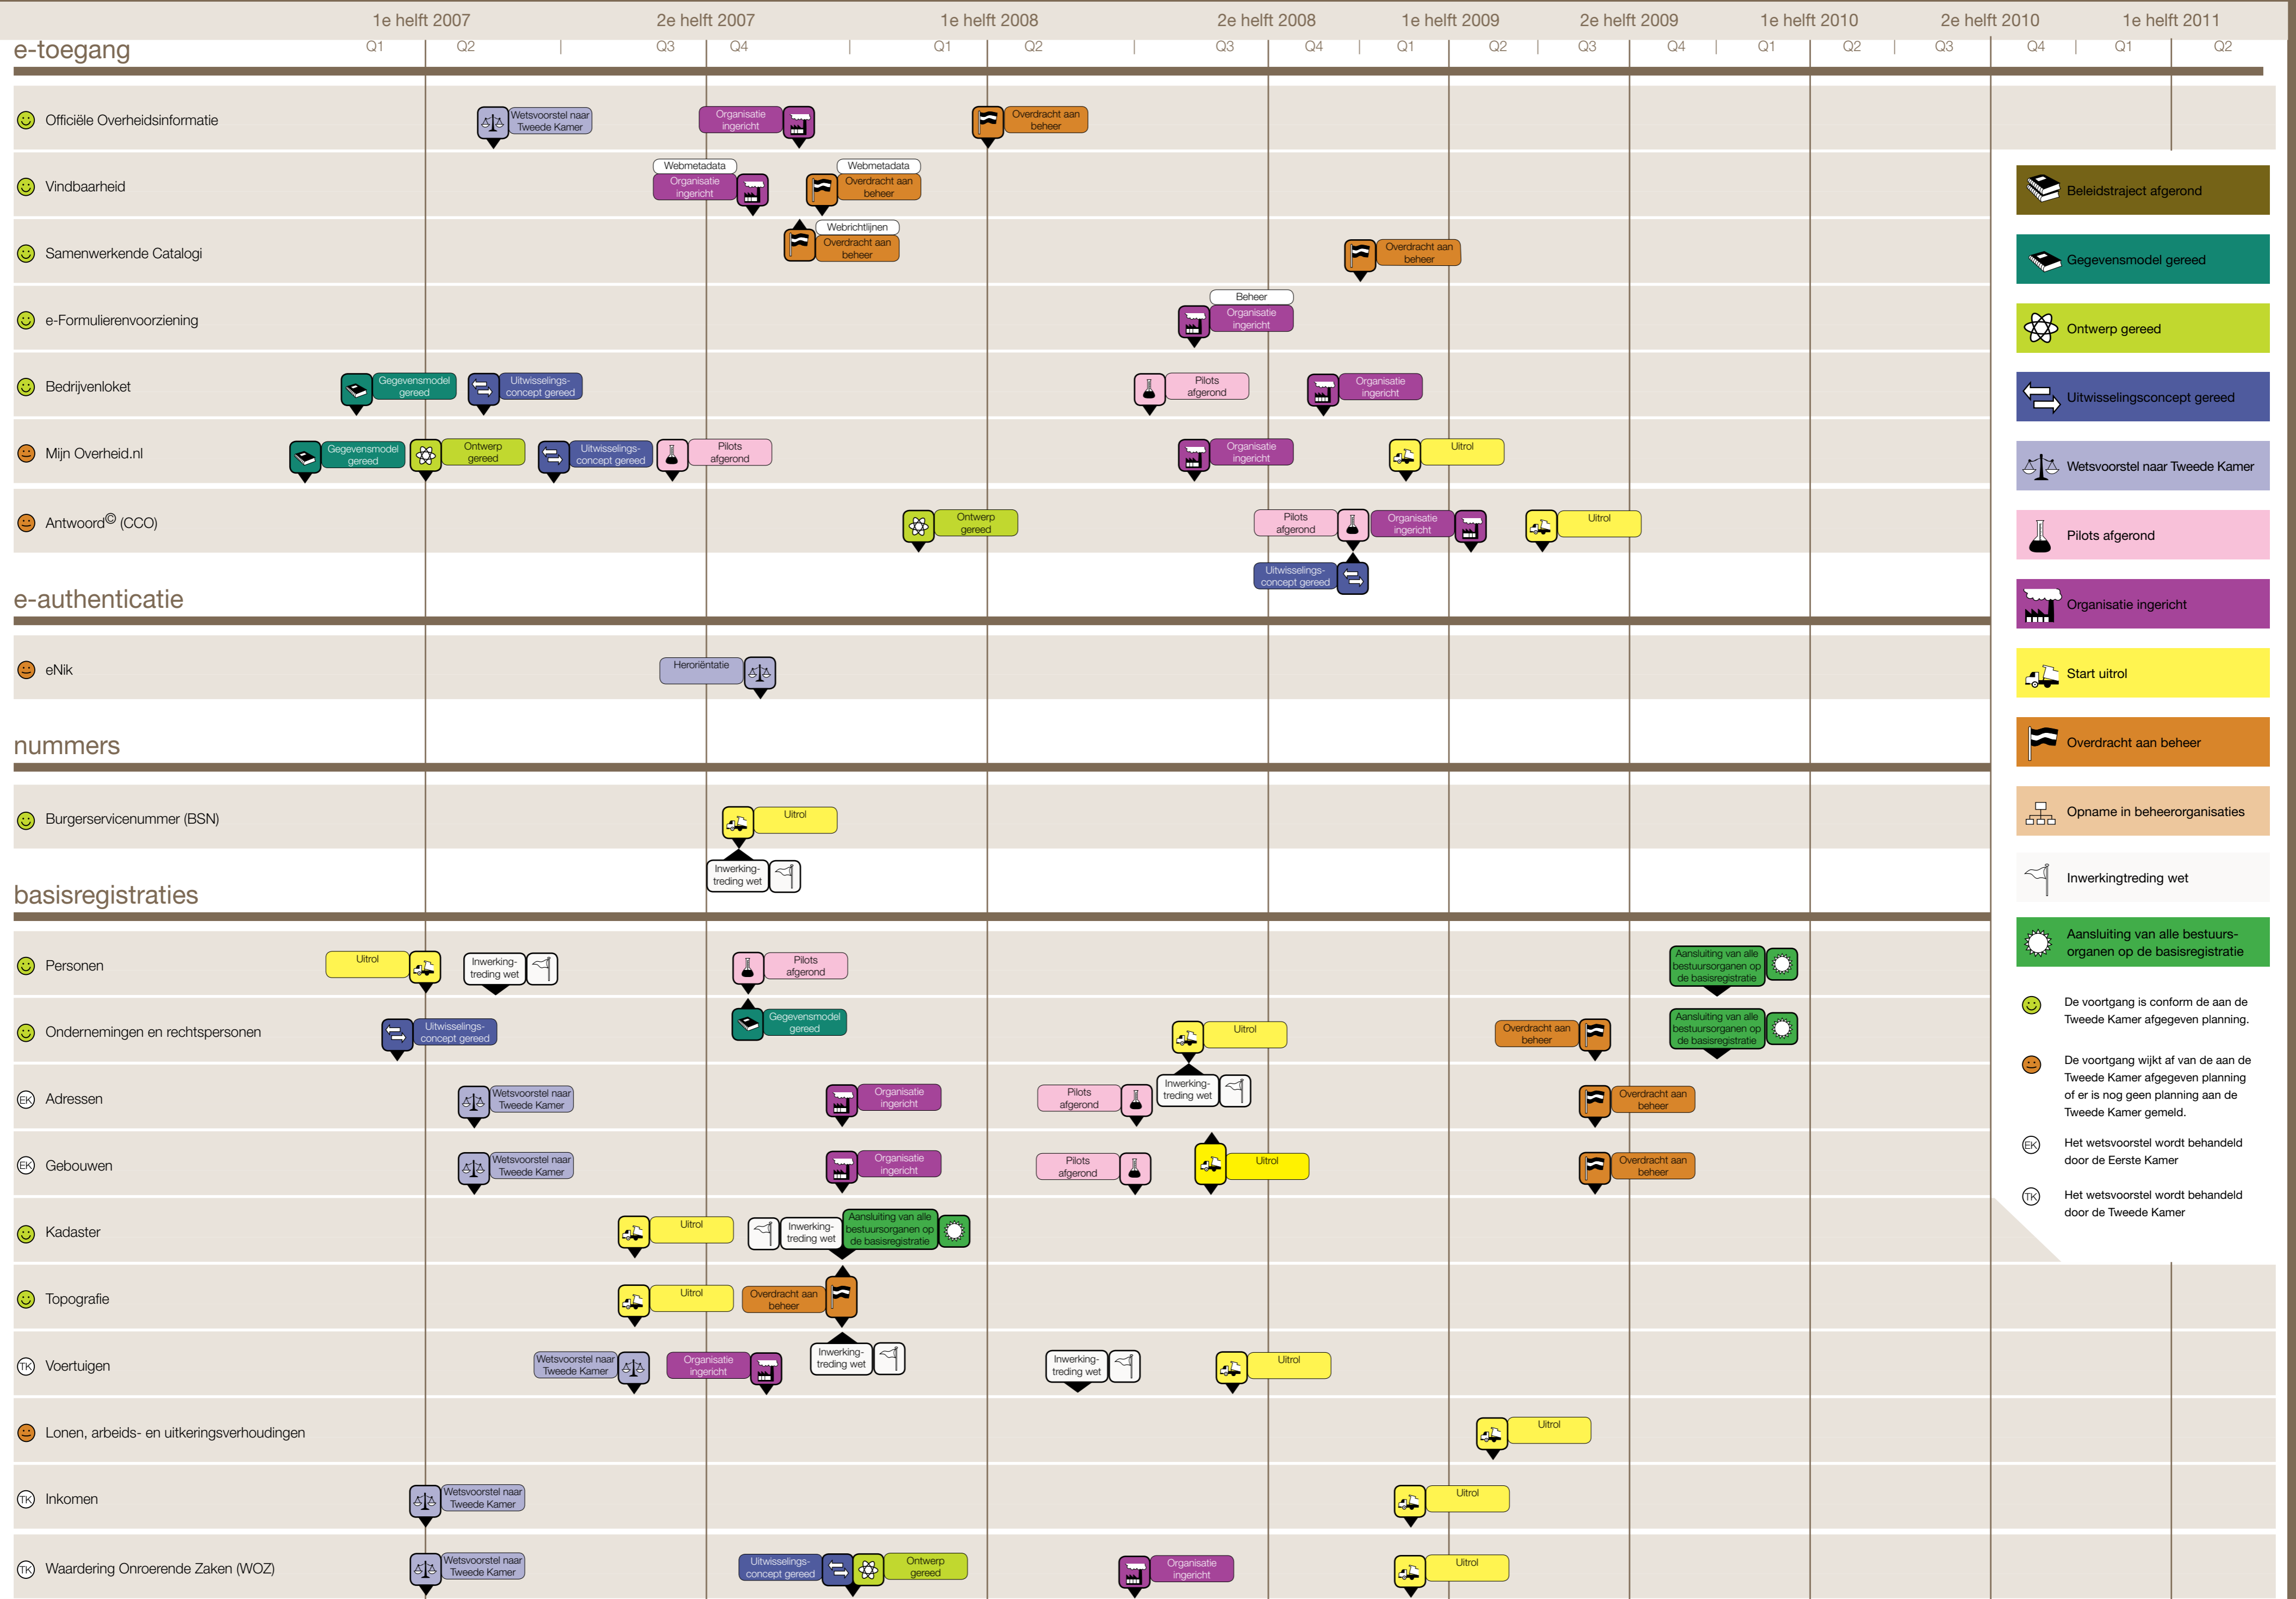

Toelichting ‘mijlpalen’

In het e-overheid planningsoverzicht wordt gebruik gemaakt van iconen die een aantal mijlpalen in de totstandkoming van een basisvoorziening omvatten. De totale iconenset ziet er als volgt uit:

e-overheid
1e tussentijdse voortgangsrapportage



Beleidstraject afgerond

Het ambtelijke traject bestaat vaak uit een verkenning, een haalbaarheidsstudie en vervolgens een realisatiebesluit. Al deze stappen ondersteunen de beleidscyclus. Het einde van het beleidstraject kenmerkt zich vaak door een realisatiebesluit waarvan de Tweede Kamer op de hoogte wordt gesteld. Het eindresultaat van het beleidstraject geeft informatie over de voornemens t.a.v. de e-overheid en de globale planning ervan.



Gegevensmodel gereed

Met het vastleggen van een gegevens of datamodel leg je de scope en reikwijdte van de voorziening vast en bepaal je welke gegevens in de toekomst wel en niet worden opgeslagen en hoe. Ook worden de relaties met andere gegevenssets gelegd. Met het gegevensmodel wordt dus veel gezegd over het toepassingsgebied van de voorziening en de plek in de gehele e-overheid.



Ontwerp gereed

Naast het ontwerp van het gegevensmodel moeten er ook functionele en technische specificaties worden opgesteld over hoe de voorziening moet werken. Als dit verder wordt uitgewerkt is er een blauwdruk, bestek of ontwerp waarin de werking van de basisvoorziening is vastgelegd. Op basis van het ontwerp kunnen organisaties een beeld krijgen van hoe de nieuwe voorziening er uit gaat zien.



Uitwisselingsconcept / aansluitvoorwaarden gereed

De basisvoorzieningen worden gerealiseerd om in combinatie met andere voorzieningen informatie uit te wisselen, op te slaan en functionaliteit aan gebruikers te bieden. Omdat samenwerking tussen meer en nieuwe partijen plaats vindt moeten er afspraken worden gemaakt over standaarden en concepten om gegevens met elkaar te kunnen delen. Ook kan er sprake zijn van aansluitvoorwaarden: waar moet een organisatie/ infrastructuur aan voldoen om gebruik te kunnen maken van de voorziening? Als dit bekend is kunnen organisaties inschatten welke aanpassingen zij moeten doorvoeren om van de voorziening gebruik te maken.



Wetgeving voor definitieve besluitvorming aan Tweede Kamer aangeboden

Een aantal basisvoorzieningen zal pas ten volle gebruikt kunnen worden als er nieuwe of aangepast wetgeving is die gebruik mogelijk maakt of verplicht stelt. Wetgeving maakt daarom deel uit van de projectplanning van basisvoorzieningen. De wet geeft organisaties inzicht in de juridische implicaties van het gebruik van de voorziening. In sommige overzichten is een nadere detaillering van het wetstraject gewenst, in dat geval worden meerdere 'weticonen' in de lijn uitgezet en wordt in de bijbehorende tekstballon de wetgevingfase weergegeven.



Pilots afgerond

In veel programma's die basisvoorzieningen realiseren is een periode opgenomen om op kleinere schaal te testen hoe het meest optimaal gebruik wordt gemaakt van de voorziening. Dit leidt meestal tot kleine aanpassingen en het opdoen van eerste ervaringen.



Organisatie ingericht

Nadat de basisvoorziening is ontwikkeld zal hij nog vele jaren blijven bestaan en worden doorontwikkeld. Daarvoor is een organisatie nodig, waarin het beheer en onderhoud van de voorziening zijn belegd, inclusief de bijbehorende procedures, gebruikersraden etc. In het project moeten daarvoor reeds voorzieningen worden getroffen.



Start uitrol

De voorziening is gereed en kan door derden worden gebruikt. De voorziening wordt beschikbaar gesteld, gekoppeld of op een andere manier middels een implementatieplan in gebruik genomen.



Overdracht aan beheer

Hiermee wordt aangegeven wanneer het project is afgerond en is overgedragen aan de organisatie die het beheer en onderhoud uitvoert. In sommige trajecten is het gewenst om de geplande uitrolresultaten weer te geven.



Opname in beheerorganisatie

Wanneer een basisvoorziening wordt overgedragen aan beheer, vindt opname in de daarvoor bestemde beheerorganisatie plaats.

Planningsoverzicht e-overheid
